



工事のお知らせ (6月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年6月度

【撮影 R4.5.24】

工事概要

住民の皆様へ

【新規工事受注のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。4月20日に伐採を開始して、5月16日から沈砂池設置・大型土のう設置による土砂流出対策を行い、現在、第4法面を掘削中です。

6月の作業は、掘削した土砂を市道愛宕線を通りC工区へ運搬し、法面工も着手します。

引続き安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。



工事場所 兵庫県洲本市宇山地先

工期 令和4年4月1日～令和5年2月24日

作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

現在の施工状況



施工者：株本建設工業株式会社

現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014

監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174

現場事務所(炬口漁港内)

洲本バイパス 宇山地区改良工事

No.1～20



株本建設工業(株)




確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社

【工事内容】

- 掘削工: 8,530m³、残土処理工: 7,670m³、コンクリート吹付工: 879m²、法枠工: 1,577m²
- 鉄筋挿入工: 119本、削孔同時注入工: 524本、排水構造物工: 1式、構造物撤去工: 1式

【作業内容 今月(6月)作業予定】

- 残土処理工(C工区へ運搬)
- コンクリート吹付工
- 削孔同時注入工
- 法枠工

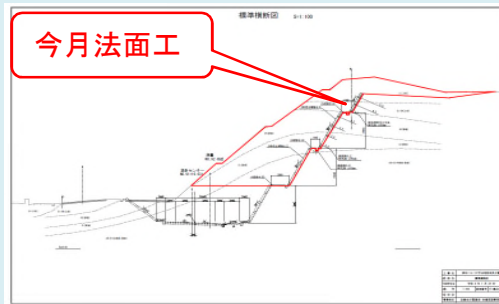

工程表

	5月		6月					備考
	25	30	5	15	20	25	30	
残土処理工			残土処理(C工区へ)					森長組の現場へ搬出
コンクリート吹付工								
法枠工								
削孔同時注入工								

掘削状況

