

(9月度)工事のお知らせ(宇山地区)

住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めています。
 工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力
 少なくなるよう工事を進めています。
 皆様のご理解とご協力をよろしく申し上げます。

工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 平成30年9月28日～令和元年10月30日(※工期12月末まで延期予定)
- 作業時間 9:00 ~ 17:00
- 工事内容
 - ・掘削工：14,000m³
 - ・盛土工：840m³
 - ・排水構造物：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・舗装工：1,770m²

工程

- 9月度の予定
 - ・切土工 (洲本中川原線を迂回路誘導)
 - ・残土搬出 (現場⇒養宜地区)

(ダンプゼツケン)※イメージ




○9月度の予定

9月	5	10	15	20	25	30	備考
切土工	---	---	---	---	---	---	切土部
残土搬出	---	---	---	---	---	---	養宜(南あわじ市)
岩掘削	---	---	---	---	---	---	ビッカー工法
交通規制	---						9月上旬～下旬 洲本中川原線 迂回路誘導

※切土部では岩盤を掘削していくことになります。従来のブレイカによる割岩ではなく、より振動を抑えられるビッカー工法で岩盤を割って行きます。

※硬い岩が当初想定していた量より多く、1日当りの掘削量が少なくなったので工期延期となる予定です。

現在の進捗状況・予定

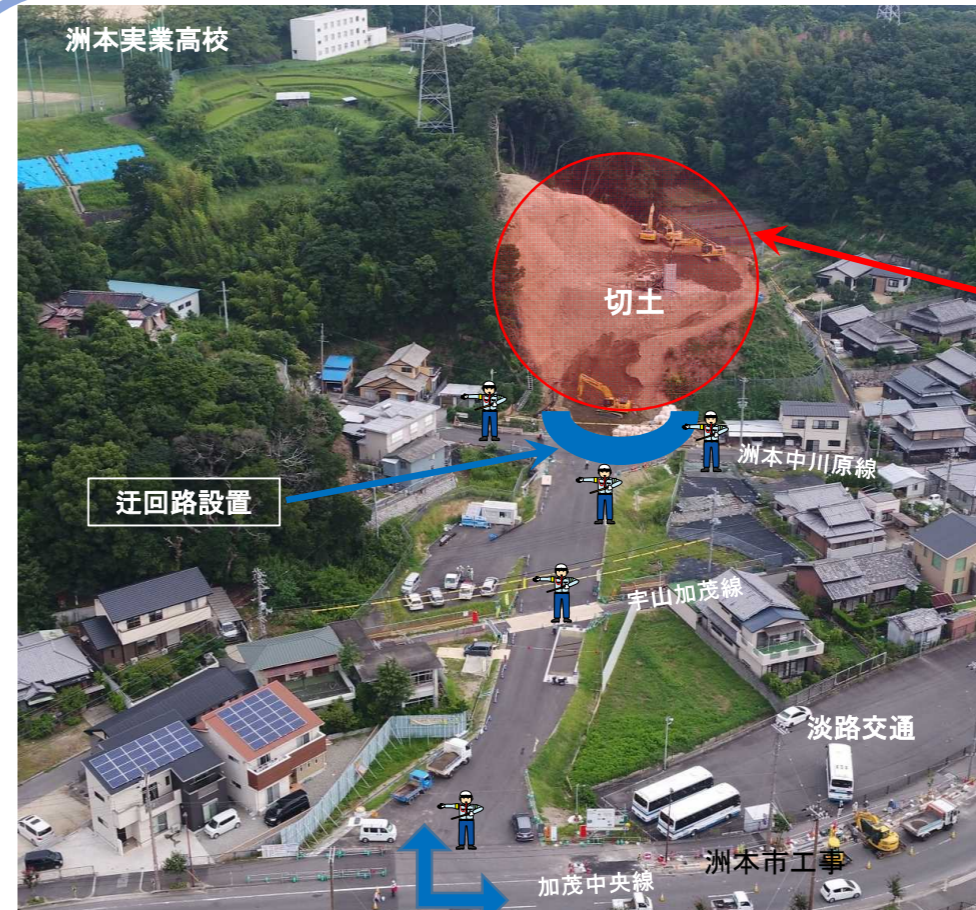

撮影日 R1.8.19

9月度
施工範囲

9月上旬から下旬まで切土作業に伴う迂回路への交通誘導(予定)
 天候等により変更する場合があります。

残土搬出
 交通誘導警備員の指示に従い、
一般車両、歩行者優先で通行します。

※右折進入
 ※左折退出

施工状況写真

○8月度の施工状況



中硬岩の割岩の施工状況です。まずクローラドリルで削孔します



削孔した箇所にビッカーを差し込み、油圧で押し広げ、振動や騒音もなく割岩を行います



ウェッジライナー挿入状況

ダンプトラックの運搬土量を最大化するペイロードメータ NEW
 PC200L-11はタブレットによる簡単な操作で、バケットで掘削した土の重量の表示と、ダンプトラックへの積載重量の管理ができます。
 ※アームクレーン仕様のみの機能です。
 ※タブレットおよび取り付けアタッチメントは付属していません。



掘削土の積込みにペイロードメータを使用し、一台毎の重量管理を行って過積載を防止しています



切土中は愛宕線に落石や異常がないか、点検を行っています

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

宇山地区進入路設置工事 作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

現場代理人：安井 陽平、監理技術者：村上 健一

