

# (10月度)工事のお知らせ(宇山地区)

## 住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めていきます。  
 工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力  
 少なくなるよう工事を進めていきます。  
 皆様のご理解とご協力をよろしく申し上げます。

## 工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 平成30年9月28日～令和元年10月30日(※工期令和2年1月31日まで延期予定)
- 作業時間 9:00 ~ 17:00
- 工事内容
  - ・掘削工：14,000m<sup>3</sup> ・盛土工：840m<sup>3</sup> ・排水構造物：1式
  - ・構造物撤去工：1式 ・舗装工：1,770m<sup>2</sup>

## 工程

- 10月度の予定
  - ・切土工 (洲本中川原線を迂回路誘導)
  - ・残土搬出 (現場⇒養宜地区)

(ダンプゼツケン)※イメージ



○9月度の予定


10月	5	10	15	20	25	30	備考
切土工	---	---	---	---	---	---	切土部
残土搬出	---	---	---	---	---	---	養宜(南あわじ市)
岩掘削	---	---	---	---	---	---	ビッカー工法
交通規制	---						10月上旬～下旬 洲本中川原線 迂回路誘導

※切土部では岩盤を掘削していくことになります。従来のブレイカによる割岩ではなく、より振動を抑えられるビッカー工法で岩盤を割って行きます。

※硬い岩が当初想定していた量より多く、1日当りの掘削量が少なくなったので工期延期となる予定です。

※工期延期となってしまう、付近の皆様にはご迷惑をおかけしてしましますが、早期完了に向けて努力していきますので、引き続きご協力よろしく申し上げます。

## 現在の進捗状況・予定

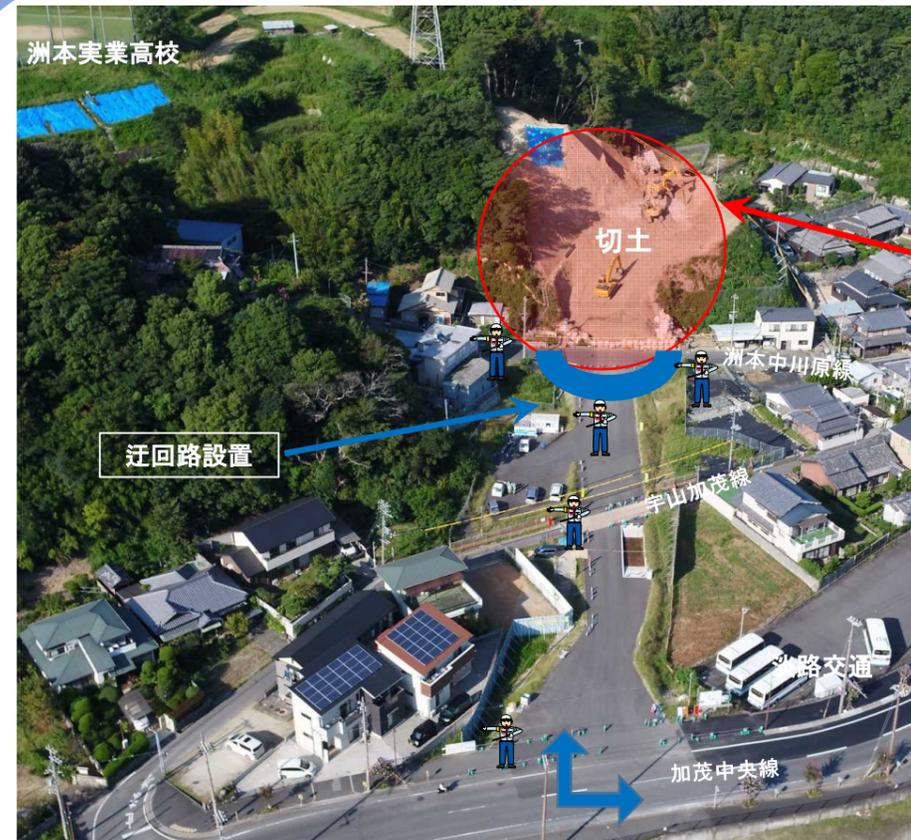

撮影日 R1.9.17

10月度  
施工範囲

10月上旬から下旬まで切土作業に伴う迂回路への交通誘導(予定)  
 天候等により変更する場合があります。

残土搬出  
 交通誘導警備員の指示に従い、  
**一般車両、歩行者優先**で通行します。

※右折進入  
 ※左折退出

## 施工状況写真

○9月度の施工状況



土質の試験を行い、使用可能な土であることを確認しています



掘削が進み、着手前に比べ、地山が低くなってきています



愛宕線側の切土の状況です。落石等がないよう慎重に作業しています

完成まで残り約3,000m<sup>3</sup>です。



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

宇山地区進入路設置工事 作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

現場代理人：安井 陽平、監理技術者：村上 健一

