



迎春


工事ビラ (1月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

【令和2年1月】

本年もよろしくお願いいたします。



現在の施工状況

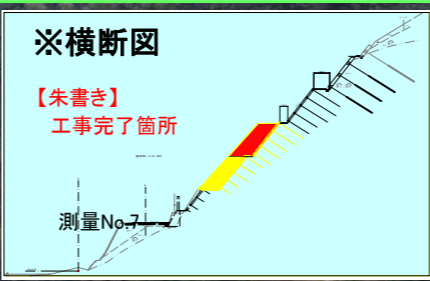

今回工事の施工範囲



【撮影日 R1.12.19】

状況写真

第1法面 掘削状況

第2法面 吹付砕施工状況



濁水対策(沈砂設備)

※濁った水を沈砂させています!



工事概要

住民の皆様へ 【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。
炬口地区における当工事は皆様の協力により予定通り進み、あと2ヶ月で完了します。
工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、昨年同様に引き続き皆様のご理解とご協力を、
お願いいたします。

工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)
工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日
作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)



施工者：株本建設工業株式会社
現場代理人：馬場 正永
監理技術者：尾崎 範徳
現場事務所(炬口漁港内)
☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226



確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社

【工事内容】

- 掘削工: 28,300m³、残土処理工: 28,300m³、モルタル吹付工: 755m²
- 法面工: 1,609m²、アンカー工: 26本、鉄筋挿入工: 474本、排水工: 296m

【作業内容 今月(1月)作業予定】

- 道路土工(第1法面) 掘削、法面整形
- 法面工(第2法面) 鉄筋挿入工
- 排水構造物工(第2法面) 小段排水
- 残土運搬 塔下地区へ運搬

工事用車両ゼッケン (NO.1～No.20)

W1000×H500

洲本バイパス
炬口地区法面改良工事

No. 1

工程表

	1月						備考
	5	10	15	20	25	30	
掘削工 (第1法面)	正月休み 12/28 1/5	掘削、法面整形、積込					
法面工 (第2法面)		モルタル吹付		鉄筋挿入工			
排水構造物工 (第2法面)					小段排水		
残土運搬工 (塔下へ)			塔下	1/10に残土運搬は完了予定です			洲本市五色町鮎原 (塔下)
交通誘導警備員							炬口出入口3名配置

※正月休み(12/28～1/5)
