



工事のお知らせ (7月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年7月度

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。4月20日に伐採を開始して、5月16日から沈砂池設置・大型土のう設置による土砂流出対策を行い、現在、第4法面の掘削が完了し、法面工を施工中です。

7月の作業は、4段目法面工の続きで、削孔同時注入工及び法枠工を施工し、完了後は小段排水工と3段目の掘削及び残土場外搬出を行います。引続き安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先
工期 令和4年4月1日～令和5年2月24日
作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)



現在の施工状況

今回工事の施工範囲

【撮影 R4.6.17】



施工者：株本建設工業株式会社
現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014
監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174
現場事務所(炬口漁港内)

洲本バイパス
宇山地区改良工事
No.1～20
株本建設工業(株)




確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社

【工事内容】

- 掘削工：8,530m³、残土処理工：7,670m³、コンクリート吹付工：879m²、法枠工：1,577m²
- 鉄筋挿入工：119本、削孔同時注入工：524本、排水構造物工：1式、構造物撤去工：1式

【作業内容 今月(7月)作業予定】

- 掘削工
- 残土処理工
- 削孔同時注入工
- 法枠工
- 排水構造物工

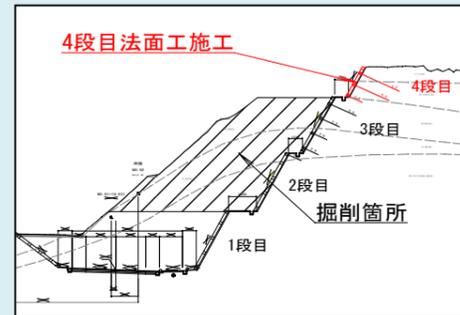

工程表

	6月		7月					備考
	25	30	5	15	20	25	30	
掘削工 残土処理工								場外搬出
法枠工			—————					
削孔同時注入工	—————							
排水構造物工				—————				

4段目法面施工状況



土砂流出防止(シート養生)



防塵対策(万能塀設置)

