



工事のお知らせ (9月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年9月度

【撮影 R4.8.22】

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。
 4/20から施工を開始し、現在は3段目法面を施工中です。
 9月の作業は、引き続き3段目の法面工を行い、残土は場外へ運搬します。
 また8/22よりA工区（市道加茂中央線より南側）に着手し、工事用道路設置を行ってから市道の迂回路を設置して10月に切り替える予定です。
 安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先
 工期 令和4年4月1日～令和5年2月24日
 作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

現在の施工状況



施工者：株本建設工業株式会社
 現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014
 監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174
 現場事務所(炬口漁港内)

洲本バイパス 宇山地区改良工事

No.1～20

株本建設工業(株)



確かな技術 豊かな心で未来を築く
 株本建設工業株式会社




【工事内容】

- ・掘削工:8,530m³、残土処理工:7,670m³、コンクリート吹付工:879m²、法枠工:1,577m²
- ・鉄筋挿入工:119本、削孔同時注入工:524本、排水構造物工:1式、構造物撤去工:1式

【作業内容 今月(9月)作業予定】

- ・掘削工、残土処理工
 - ・法面工
 - ・鉄筋挿入工
 - ・工事用道路・迂回路設置、表土掘削
 - ・構造物撤去工
- } B工区 施工中
} A工区 8/22から着手しました。

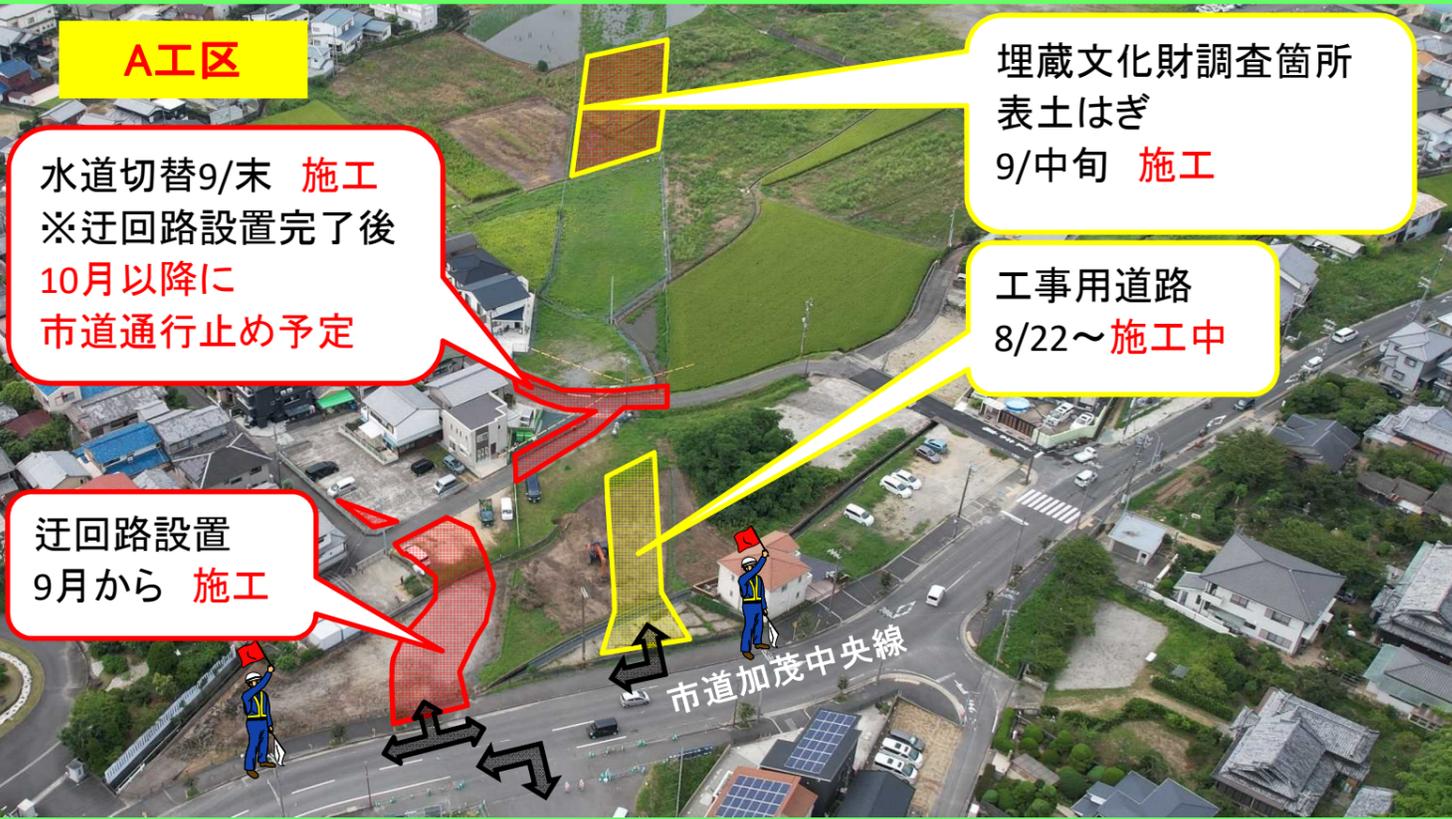

工程表

| | 8月 | | 9月 | | | | | 備考 |
|------------------|---------|----|--------|----|----|----|-----|------|
| | 25 | 30 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| B工区 掘削工 残土処理工 | 3段目 | | | | | | 2段目 | 場外運搬 |
| 法面工他 | 3段目 | | 排水構造物工 | | | | | |
| A工区 工事用道路他 | 工事用道路設置 | | 迂回路設置 | | | | | |
| 構造物撤去工他 | 構造物撤去 | | 表土掘削運搬 | | | | | |
