

(8月度)工事のお知らせ(宇山地区)

住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めていきます。
 工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力
 少なくなるよう工事を進めていきます。
 皆様のご理解とご協力をよろしく申し上げます。


工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 平成30年9月28日～令和元年10月30日
- 作業時間 9:00 ~ 17:00
- 工事内容
 - ・掘削工：14,000m³
 - ・盛土工：840m³
 - ・排水構造物：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・舗装工：1,770m²

工程

- 8月度の予定
 - ・切土工 (洲本中川原線を迂回路誘導)
 - ・残土搬出 (現場⇒平川柳沢線・養宜地区)

(ダンプゼツケン)※イメージ



○8月度の予定

8月	5	10	15	20	25	30	備考
切土工	■	■	■	■	■	■	切土部
残土搬出	■	■	■	■	■	■	平川柳沢(淡路市) 養宜(南あわじ市)
岩掘削	■	■	■	■	■	■	ビッカー工法
交通規制	■	■	■	■	■	■	8月上旬～下旬 洲本中川原線 迂回路誘導


※切土部では岩盤を掘削していくことになります。従来のブレイカによる割岩ではなく、より振動を抑えられるビッカー工法で岩盤を割って行きます。



ドリルで岩盤に穴を開けます



ビッカー(くさび状のセリ矢)を使用して油圧の力で岩を割ります



割岩のイメージ

現在の進捗状況・予定



撮影日 R1.7.16

8月度
施工範囲

8月上旬から下旬まで切土作業に伴う迂回路への交通誘導(予定)
 天候等により変更する場合があります。

残土搬出
 交通誘導警備員の指示に従い、
一般車両、歩行者優先で通行します。


※右折進入
 ※左折退出

施工状況写真

○7月度の施工状況



バックホウに備え付けてあるモニターを見て法面を整形しています。

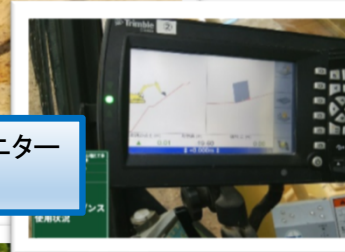

土砂から岩盤に変化しており、その確認を発注者の方にしてもらっています。



ICT施工の当現場の取り組み等について出入口の掲示板に掲示しています。



洲本維持出張所管内の安全衛生協議会で現場のパトロールに来ていただきました。

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

宇山地区進入路設置工事 作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

現場代理人：安井 陽平、監理技術者：村上 健一

