

# 工事ビラ (8月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

令和元年8月度

## 工事概要

### 住民の皆様へ

#### 【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区において、法面工も始まり工事最盛期となりました。残土運搬は8月中は中断して、9月初旬から運搬予定です。工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力を、お願いします。



工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)  
 工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日  
 作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社  
 現場代理人：馬場 正永  
 監理技術者：尾崎 範徳  
 現場事務所(炬口漁港内)  
 ☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226

確かな技術 豊かな心で未来を築く  
**株本建設工業株式会社**



## 現在の施工状況

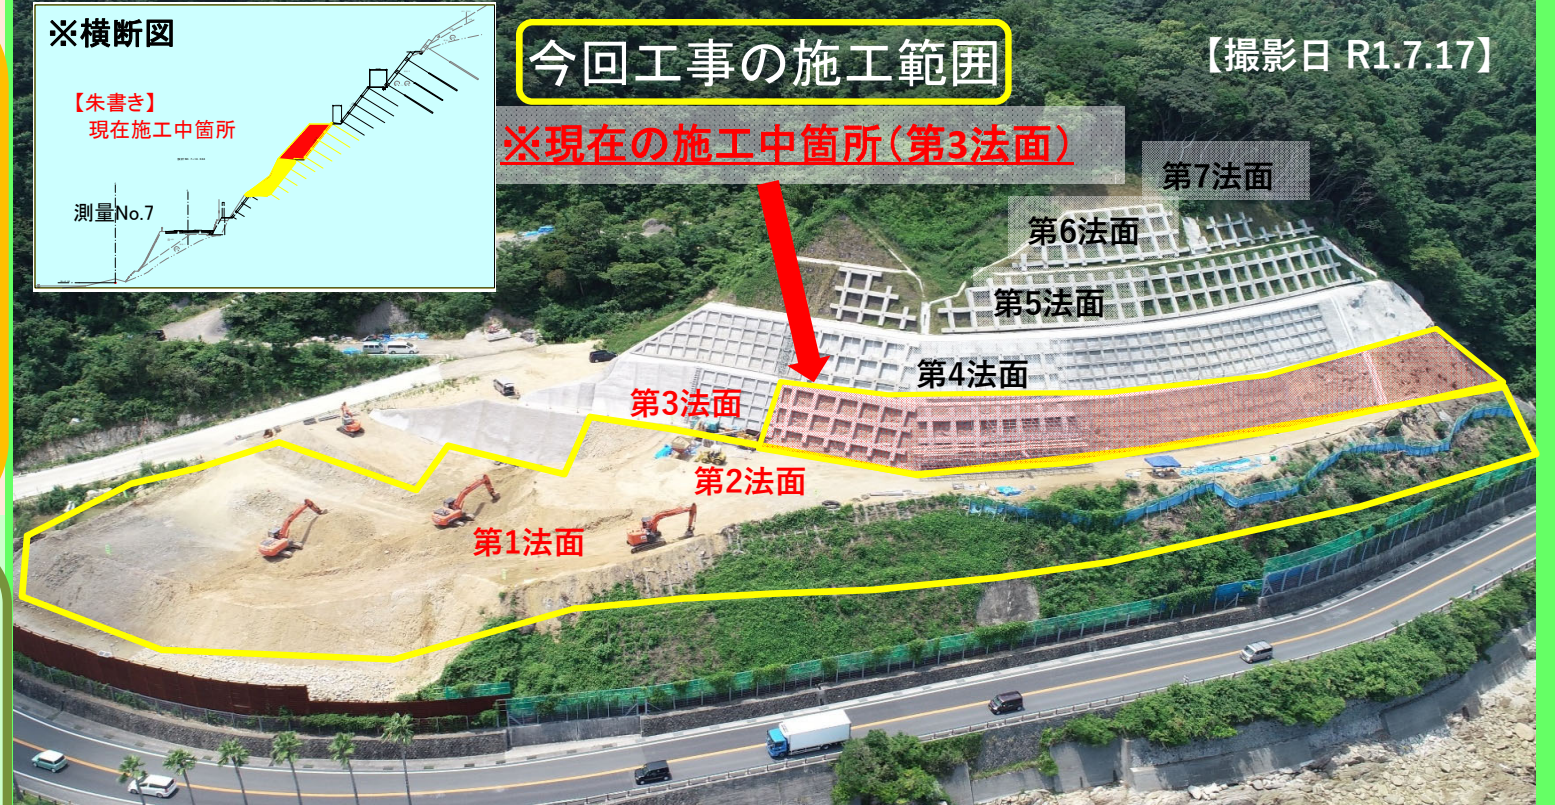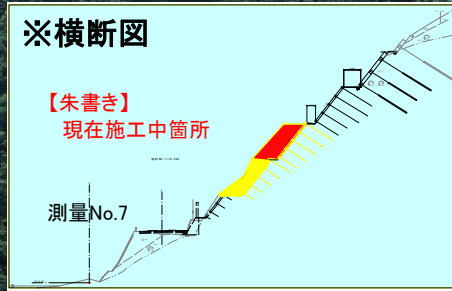

### 今回工事の施工範囲

【撮影日 R1.7.17】

## 状況写真

掘削状況(第1法面)



運搬(都志大宮圃場整備事業)



道路清掃状況(都志大宮圃場)




### 【工事内容】

- ・掘削工:19,600m<sup>3</sup>、残土処理工:19,600m<sup>3</sup>、コンクリート吹付工:524m<sup>2</sup>
- ・法枠工:1,133m<sup>2</sup>、アンカー工:26本、鉄筋挿入工:474本、排水工:313m

### 【作業内容 今月(8月)作業予定】

- ・法面工(第3法面) 吹付法枠工、コンクリート吹付工
- ・法面工(第3法面) アンカー工、鉄筋挿入工
- ・排水構造物工(第3法面) 小段排水
- ・残土運搬は無し(9月初旬から再開予定)

工事用車両ゼッケン(No.1～No.20)



## 工程表

	8月						備考
	5	10	15	20	25	30	
法面工(第3法面)	吹付法枠、コンクリート吹付				鉄筋挿入工		
	アンカー工		夏期休暇 8/11～8/18		アンカー工		
掘削工(第2法面)						掘削	
残土運搬工	8月は運搬予定なし						9月初旬から再開 南あわじ市(養宜)
排水構造物工					小段排水		

第3法面吹付枠口300吹付状況



アンカー足場組立状況

