

# (11月度)工事のお知らせ(宇山地区)

## 住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めていきます。  
 工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力少なくなるよう工事を進めていきます。  
 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。


## 工事概要

- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 平成30年9月28日～令和2年1月31日
- 作業時間 9:00 ~ 17:00
- 工事内容
  - ・掘削工：14,000m<sup>3</sup> ・盛土工：840m<sup>3</sup> ・排水構造物：1式
  - ・構造物撤去工：1式 ・舗装工：1,770m<sup>2</sup>

## 工程

- 11月度の予定
  - ・切土工 (洲本中川原線を迂回路誘導)
  - ・残土搬出 (現場⇒養宜地区・塔下地区)

(ダンプゼツケン)※イメージ




○11月度の予定

11月	5	10	15	20	25	30	備考
切土工	■	■	■	■	■	■	切土部
残土搬出	■	■	■	■	■	■	養宜(南あわじ市) 塔下(洲本市)
岩掘削	■	■	■	■	■	■	ビッカー工法
交通規制	■						11月上旬～下旬 洲本中川原線 迂回路誘導

※硬い岩が当初想定していた量より多く、1日当りの掘削量が少なくなったので  
 工期延期となりました。

※工期延期となつてしまい、付近の皆様にはご迷惑をおかけしてしまいますが、  
 11月末に残土搬出がほぼ完了できるよう努力していきますので、引き続き  
 ご協力よろしくをお願いします。

## 現在の進捗状況・予定

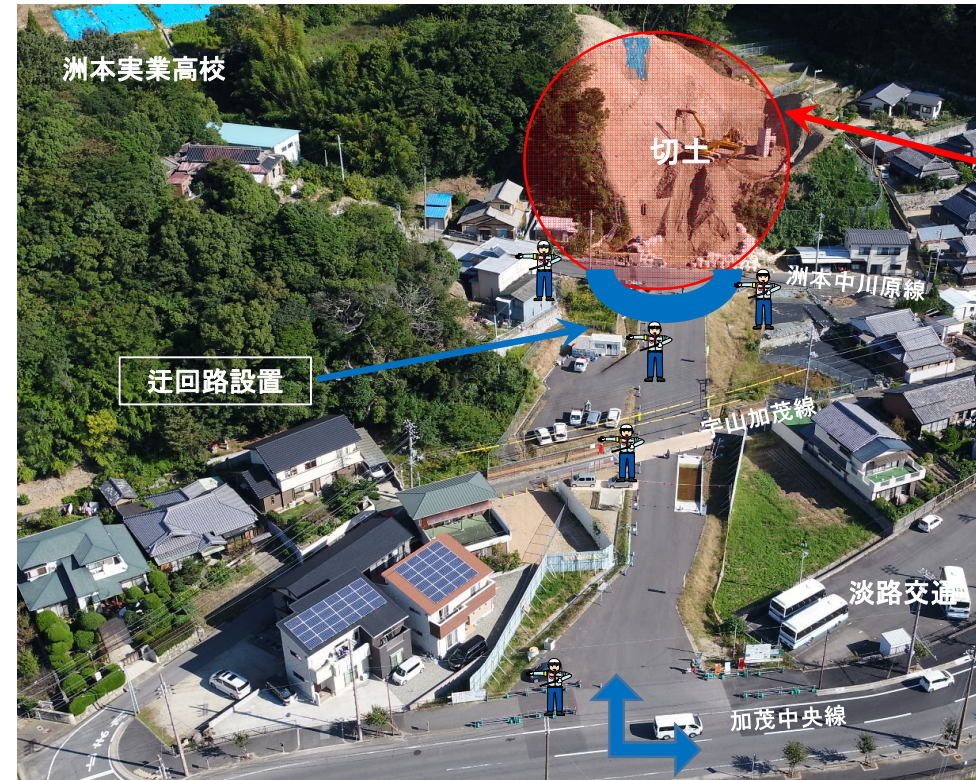

撮影日 R1.10.16

11月度  
施工範囲

11月上旬から下旬まで切土  
 作業に伴う迂回路への交通  
 誘導  
 (予定)  
 天候等により変更する場  
 合があります。

残土搬出  
 交通誘導警備員の指示に  
 従い、  
 一般車両、歩行者優先で  
 通行します。

※右折進入  
 ※左折退出

## 施工状況写真

○10月度の施工状況



愛宕線からの航空写真です。工事用道路  
 の線形が少しわかりやすくなりました。



洲本実業高校の生徒に第三回目となる  
 現場見学会を実施しました。



洲本実業高校で行われた避難訓練に向かう自衛隊の車  
 両に盛土区間の道路を開放し、通行してもらいました。

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

宇山地区進入路設置工事 作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

現場代理人：安井 陽平、監理技術者：村上 健一

