

# 工事ビラ (12月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

令和元年12月度

## 工事概要

### 住民の皆様へ

#### 【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区における工事は、皆様の協力により予定通り進んでおります。

第2法面の掘削も終わり法面工事を開始しました。第1法面では引き続き掘削及び残土運搬を行っています。運搬先は洲本市五色町鮎原塔下地区へ運搬する予定です。

工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、引き続き皆様のご理解とご協力を、お願いします。

工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)

工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日

作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合があります。)

施工者：株本建設工業株式会社

現場代理人：馬場 正永

監理技術者：尾崎 範徳

現場事務所(炬口漁港内)


☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226

確かな技術 豊かな心で未来を築く

株本建設工業株式会社




## 現在の施工状況

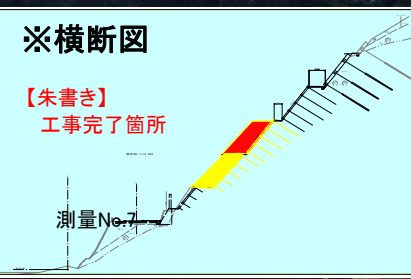

### 今回工事の施工範囲

【撮影日 R1.11.21】

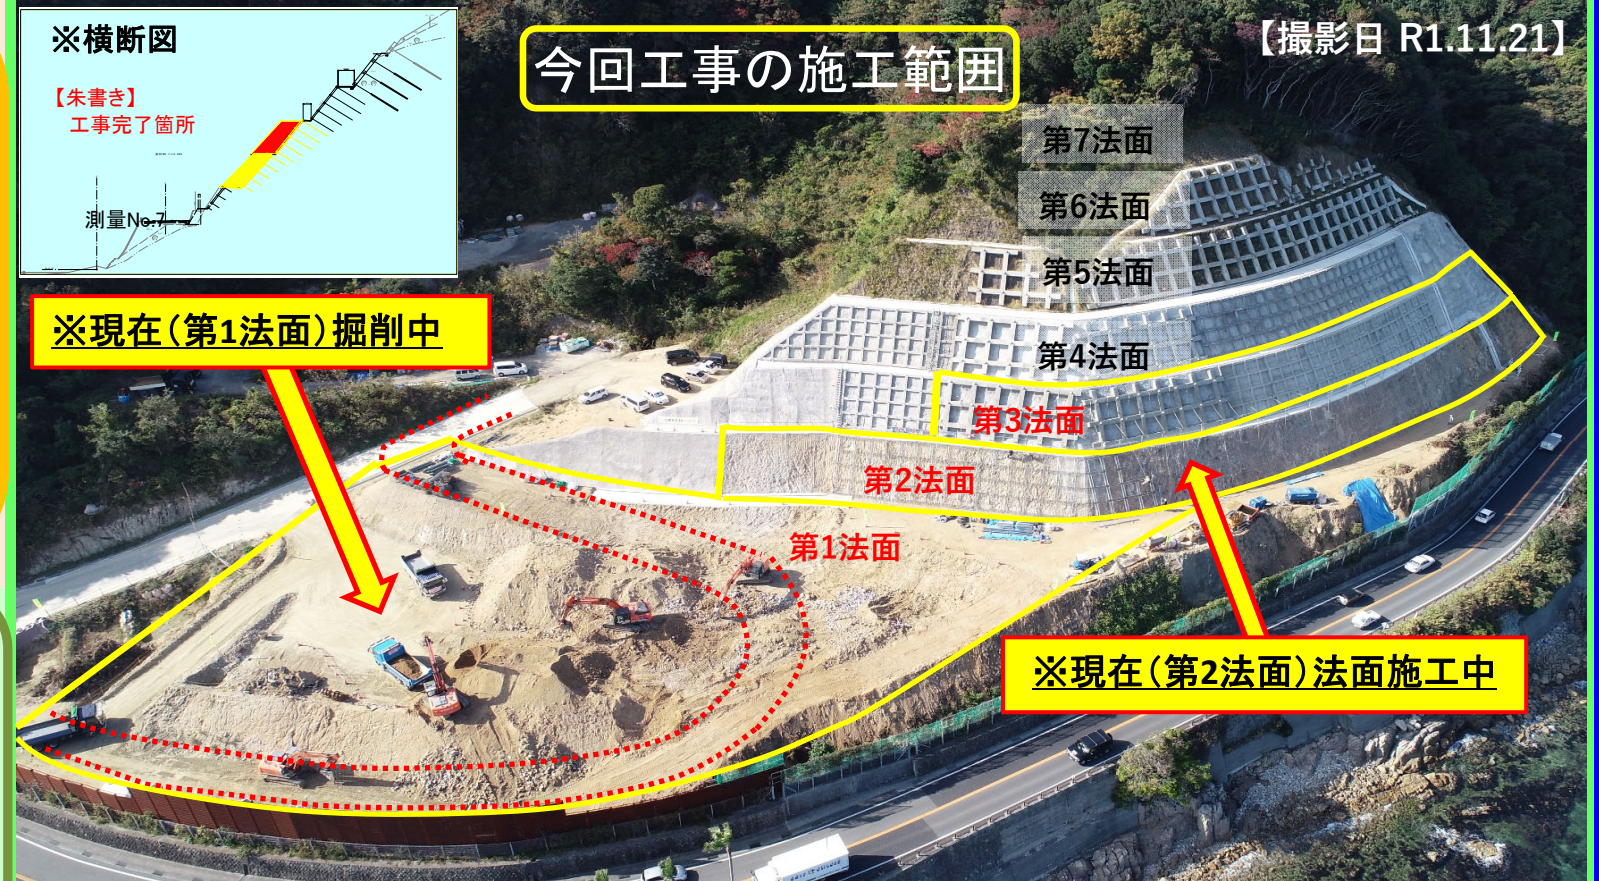

※現在(第1法面)掘削中


※現在(第2法面)法面施工中

## 状況写真

### 第2法面 掘削状況



### 第2法面 吹付枠組立状況

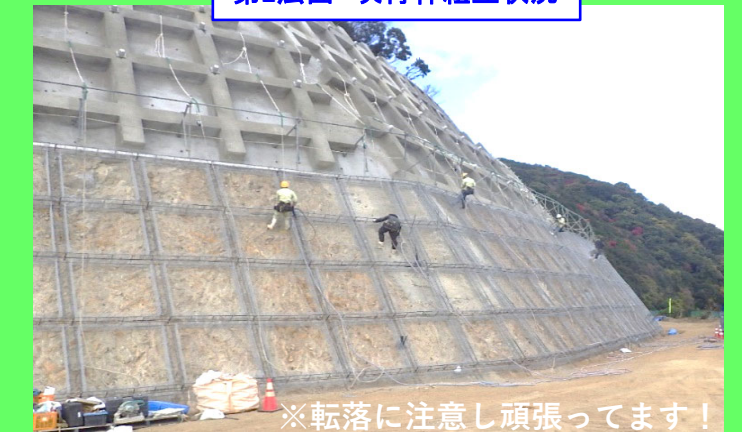

## 【工事内容】

- 掘削工: 28,300m<sup>3</sup>、残土処理工: 28,300m<sup>3</sup>、モルタル吹付工: 755m<sup>2</sup>
- 法枠工: 1,609m<sup>2</sup>、アンカー工: 26本、鉄筋挿入工: 474本、排水工: 296m

## 【作業内容 今月(12月)作業予定】

- 道路土工(第1法面) 掘削、法面整形
- 法面工(第2法面) モルタル吹付、吹付枠300
- 残土運搬 塔下地区へ運搬

工事用車両ゼッケン(No.1~No.20)

W1000×H500

洲本バイパス  
炬口地区法面改良工事

No. 1

株本建設工業(株)

## 工程表

	12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
掘削工 (第1法面)	掘削、法面整形、積込						正月休み 12/28 1/5
法面工 (第2法面)	モルタル吹付 吹付枠300						
残土運搬工 (塔下へ)	塔下						洲本市五色町鮎原 (塔下)
交通誘導警備員							炬口出入口3名配置

※正月休み(12/28~1/5)

## 島内一斉清掃参加11月10日

炬口公民館

