



工事のお知らせ (8月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年8月度

【撮影 R4.7.21】

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。4/20から施工を開始し、7月末で第4法面が完了しました。現在は3段目法面を掘削中です。8月の作業は、引き続き3段目法面の掘削及びの法面工を行い、残土を場外へ運搬します。また8/22よりA工区に着手し、工事用道路設置・表土掘削などを施工します。9月には市道の迂回路を設置して市道を撤去していきます。

引き続き安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先

工期 令和4年4月1日～令和5年2月24日

作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社

現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014

監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174

現場事務所(炬口漁港内)

確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社




洲本バイパス 宇山地区改良工事

No.1～20

株本建設工業(株)



現在の施工状況

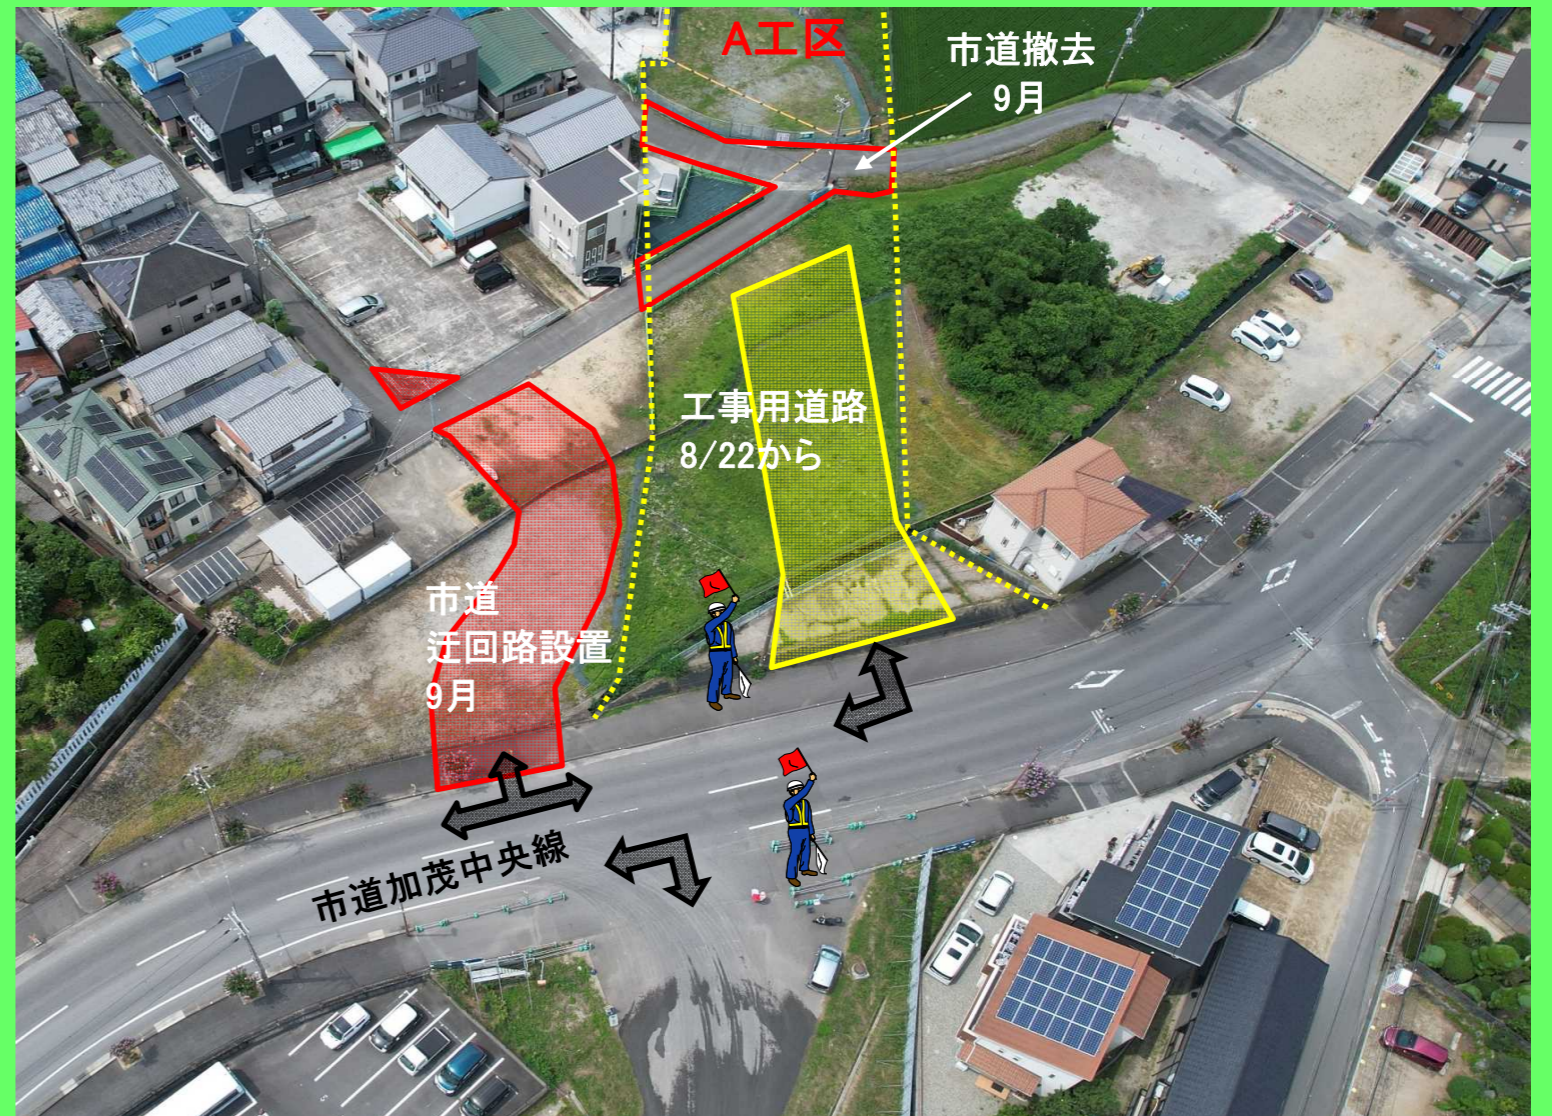

【工事内容】

- ・掘削工: 8,530m³、残土処理工: 7,670m³、コンクリート吹付工: 879m²、法枠工: 1,577m²
- ・鉄筋挿入工: 119本、削孔同時注入工: 524本、排水構造物工: 1式、構造物撤去工: 1式

【作業内容 今月(8月)作業予定】

- ・掘削工
 - ・残土処理工
 - ・法面工
 - ・工事用道路設置、表土掘削
 - ・構造物撤去工
- } B工区
} A工区 8/22から開始します



※夏期休暇: 8/11～8/16

工程表

	6月		8月						備考
	25	30	5	15	20	25	30		
B工区 掘削工 残土処理工			3段目			3段目		場外へ運搬	
法面工	4段目					3段目			
A工区 工事用道路他					工事用道路設置				
構造物撤去工他				構造物撤去			表土掘削運搬		
