



(8月度) 工事の説明(洲本バイパス宇山C地区坑口前改良工事)

近隣の皆様へ

宇山地区トンネル前の工事につきまして、**現在**新道の盛土に先立ち基礎地盤の支持力を確保するため、「**地盤改良工**」を施工しております。引き続き施工を進め、**8月下旬より**新道の本格的な盛土工事に着手し「**補強土壁工**」を実施いたします。大型の建設機械を使用しての作業となりますが工事車両の出入りや騒音・振動等につきまして、周辺環境への配慮を十分に行いながら、安全第一で作業を進めてまいります。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

工事工程表


【作業時間】
月曜日～金曜日の平日8時～17時

【夏季休暇】
8/11～8/16

R8.8月	5	10	15	20	25	31	備考
地盤改良工			夏季 休暇				
補強土壁工							
擁壁工			8/11～8/16				
交通誘導員							

宇山C地区

状況写真（撮影日：R8.7.24）

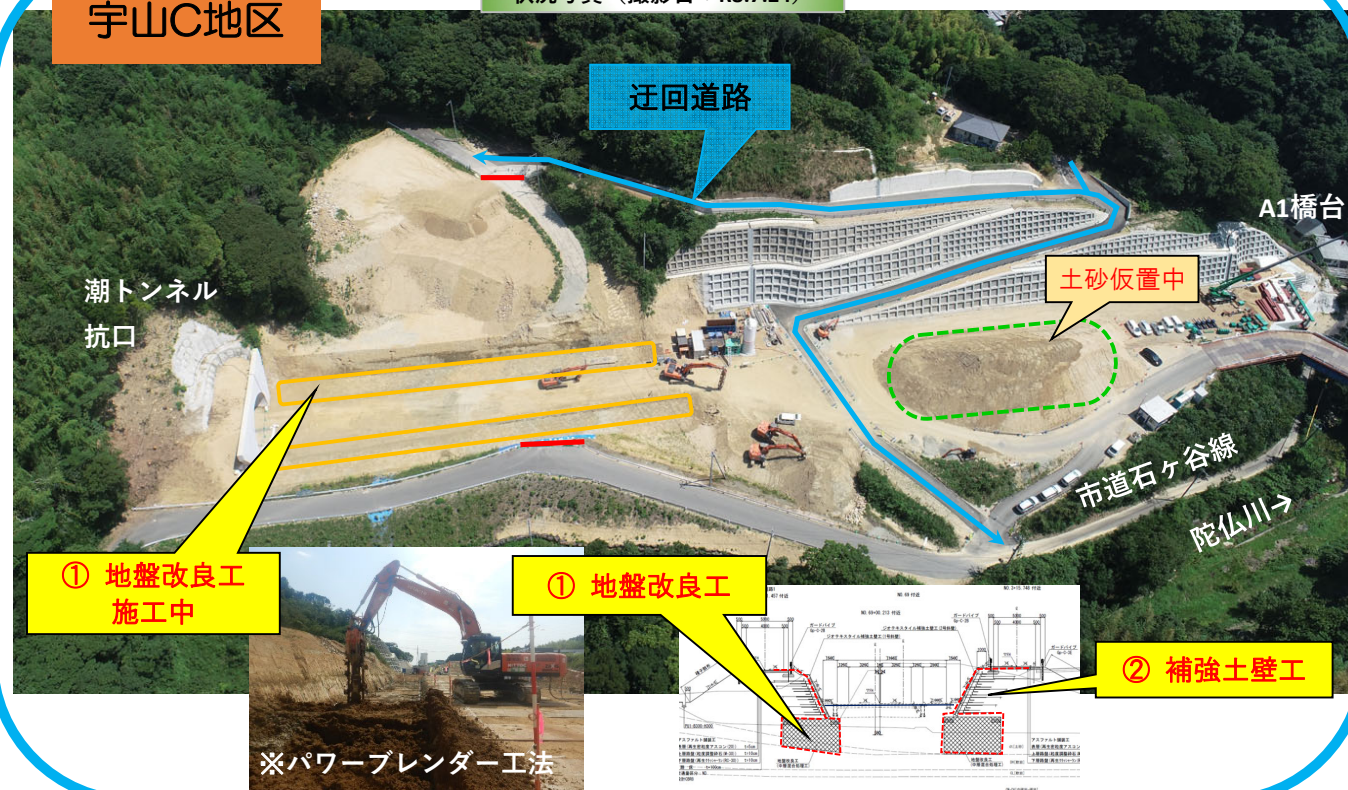

【発注者】 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所
【施工者】 株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511
【作業事務所】 洲本市炬口 炬口漁港区域内
【現場責任者】 島田 信尚（現場代理人兼 監理技術者）



確かな技術
豊かな心で未来を築く



(8月度) 工事の説明 (洲本バイパス潮トンネル舗装工事)

近隣の皆様へ

潮トンネルの舗装工事（コンクリート舗装）を担当しているガイアートです。
8月に実施予定の工事内容は、先月から引き続き「**道路付属施設工**」ハンドホール設置、配管工、「**排水構造物工**」円形水路設置工を実施いたします。
搬入車両として**8月初旬頃より材料の搬入を1日1台～5台程度(炬口側)出入口より行います。**
(交通誘導警備員配置)
工事施工中は、周辺の皆様への配慮を忘れずに進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



R8.8月 工程表	1日	5日	10日	15日	25日	31日
ハンドホール設置工				夏季 休暇		
作業土工(配管工)						
排水構造物工				8/13～8/16		

【夏季休暇】8/13～8/16



照明設置前



照明設置後



状況写真（撮影日：R8.7.24）

熱中症対策グッズ




7月に準備工として仮設ハウス、仮設トイレ、仮設照明を設置しました。

休憩所、快適トイレ設置



炬口地区



8月は道路付属施設と排水構造物の施工を実施致します。

【発注者】 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所

【施工者】 株式会社ガイアート ☎06-6446-5880

【作業事務所】 洲本市炬口1丁目3-19

【現場責任者】 菅 浩人（監理技術者）松嶋直樹（現場代理人）

ガイアくん

アートちゃん

