



工事のお知らせ (10月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年10月度

【撮影 R4.9.21】

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。現在は3段目法面・現況法面の法面工とA工区仮設道路(迂回路)を施工中です。

10月の作業は、引き続き3段目の法面工及び排水構造物工と現況法面の法面工の作業を行い、2段目を掘削し土砂は場外へ運搬します。

また、A工区で**通行止め(10/4~10/7)**による水道仮移設工事をした後、仮設道路(迂回路)を舗装し道路を切替えます。(11/1仮設迂回路に切替予定)

新しく工事を受注しました「**洲本バイパス宇山A地区改良工事**」は、11月より工事に着手します。

安全に十分注意し工事を進めていきますので、ご協力をお願いいたします。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先

工期 令和4年4月1日~令和5年2月24日

作業時間 平日 8:30~17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社

洲本バイパス宇山地区改良工事

現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014

監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174

洲本バイパス宇山A地区改良工事 (新規工事)

現場代理人・監理技術者：大羽将裕 ☎ 080-6130-6930

現場事務所(炬口漁港内)

確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社




洲本バイパス 宇山地区改良工事

No.1~20

株本建設工業(株)



現在の施工状況

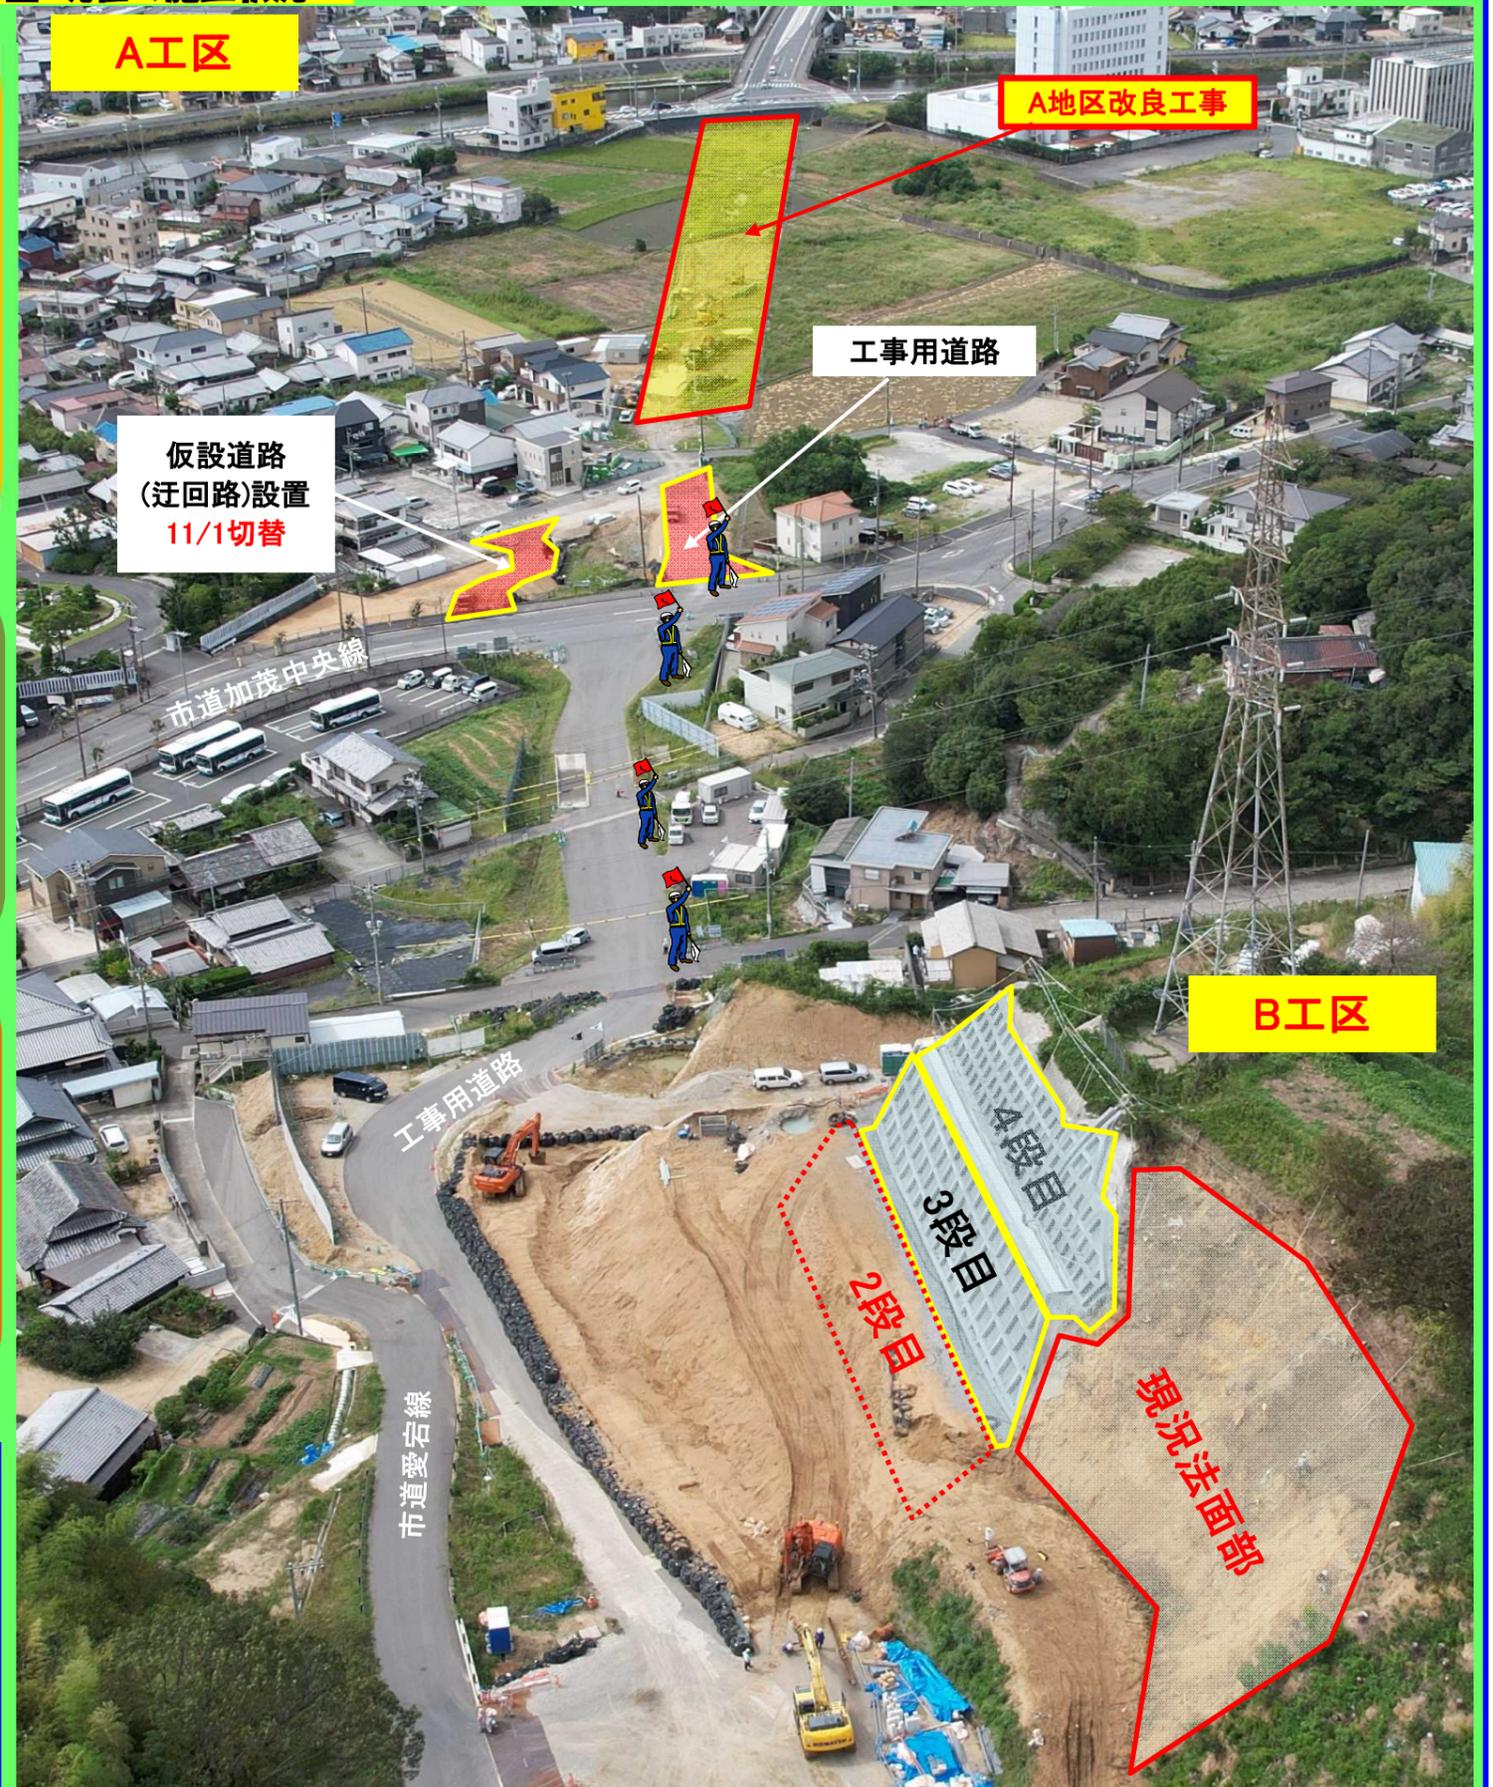

【工事内容】

・掘削工：8,530m³、残土処理工：7,670m³、コンクリート吹付工：879m²、法枠工：1,577m²

・鉄筋挿入工：119本、削孔同時注入工：524本、排水構造物工：1式、構造物撤去工：1式

【作業内容 今月(10月)作業予定】

- 掘削工、残土処理工
 - 法面工
 - 排水構造物工
 - 仮設道路設置
 - 水道仮移設工事
 - 舗装工
- B工区 (掘削工, 残土処理工, 法面工, 排水構造物工)
- A工区 (仮設道路設置, 水道仮移設工事, 舗装工)



工程表

	9月		10月					備考
	25	30	5	15	20	25	30	
B工区 掘削工 残土処理工			2段目					場外へ運搬
法面工他 3段目	鉄筋挿入工 小段排水工							
法面工 現況法面部	[Red bar indicating work]							
A工区 仮設道路他	水路工		水道工事 通行止め		舗装工事		11/1切替え予定	
