

(3月度)工事の説明(洲本バイパス陀仏川橋台他工事)

令和8年3月度

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「橋台他工事」を行っています。
 この工事は陀仏川の北側（C工区）を新設道路の計画高まで掘削し、法面補強を行ったのち、陀仏川橋の橋台を2基構築する工事です。工事車両は宇山側の市道加茂中央線から出入りします。
 現在は、橋台工でA1橋台は完成し3月初旬から埋戻しを行っています。
 A2橋台においてはコンクリート打設は完了し3月は型枠・足場を解体していきます。
 工期は3月末から6月30日に延び橋台周辺の構造物を行う予定です。
 工事に伴う騒音・振動によりご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

陀仏川橋台他工事


- 工事名：洲本バイパス陀仏川橋橋台他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和7年4月1日～令和8年6月30日

- 工事内容：
- ・掘削工：13,900m³
 - ・残土処理工：1式
 - ・法枠工：1,090m²
 - ・削孔同時注工：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・橋梁下部（橋台工）2基、付属構造物：1式
 - ・法面整形工：1,100m²
 - ・法面吹付工：950m²
 - ・鉄筋挿入工：1式
 - ・排水構造物工：1式
 - ・仮設工：1式

(3月)工事の予定

R8.3月	5	10	15	20	25	31	備考
A1橋台周辺	埋戻し及び周辺構造物						
A1橋台本体工	足場解体、埋戻しコン						
A2橋台周辺							
A2橋台本体工	コンクリート養生、型枠・足場解体						

○作業時間：8：00～17：00

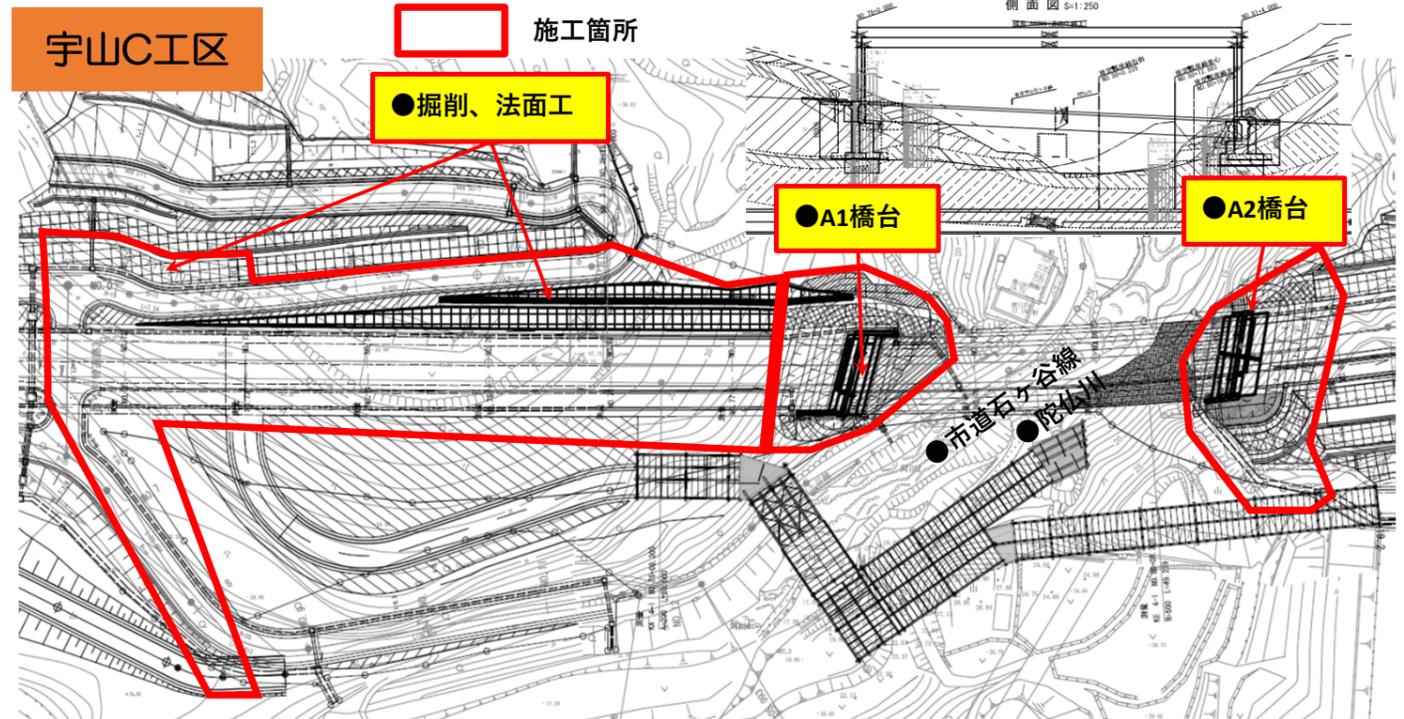

状況写真（撮影日：R8.2.24）



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内
 改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術
 豊かな心で未来を築く
