



# (5月度)工事の説明(洲本バイパス陀仏川橋台他工事)

## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「橋台他工事」を行っています。  
 現在は、橋台2基が完成しA1橋台周辺も完了しています。  
 A2橋台においては埋戻しと並行して補強土壁を施工中で、5月中旬に完了する予定です。  
 また、C地区において5/下旬にガードパイプを施工すると工事が完了します。  
 工事に伴う騒音・振動によりご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

## 陀仏川橋台他工事

○工事名：洲本バイパス陀仏川橋台他工事

○工事場所：洲本市宇山2丁目

○工期：令和7年4月1日～令和8年6月30日

## (5月)工事の予定

○作業時間：8：00～17：00

### ○工事内容：

- 掘削工：13,900m<sup>3</sup>
- 残土処理工：1式
- 法面吹付工：950m<sup>2</sup>
- 法枠工：1,090m<sup>2</sup>
- 削孔同時注入工：1式
- 構造物撤去工：1式
- 橋梁下部（橋台工）2基、付属構造物：1式
- 法面整形工：1,100m<sup>2</sup>
- 鉄筋挿入工：1式
- 排水構造物工：1式
- 仮設工：1式

R8.5月	5	10	15	20	25	31	備考
A2橋台周辺			埋戻し				
防護柵工						ガードパイプ設置	
後片付け							

## 宇山C地区



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内

改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術 豊かな心で未来を築く




# お知らせ 洲本バイパス陀仏川橋上部工事

令和8年5月度

工事進捗に伴い、新たに陀仏川橋上部工事を受注しましたのでお知らせします。  
 陀仏川橋は橋長64mの鋼製橋梁で、**現在、工場製作を進めている状況です。**  
**5/中旬より現場でのヤードの整備及び仮設工に着手します。**  
 無事故・無災害・早期完成を目指して工事を進めていきたいと思っておりますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。

工事名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事	工事概要	工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工等
路線名	洲本バイパス	受注者	高田機工株式会社
工事場所	兵庫県洲本市宇山2丁目地先		TEL 06-6649-5110
工期	自) 令和7年8月12日 至) 令和9年1月29日		
	鋼単純細幅箱桁橋 橋長：64.0m、総幅員：13.0m		

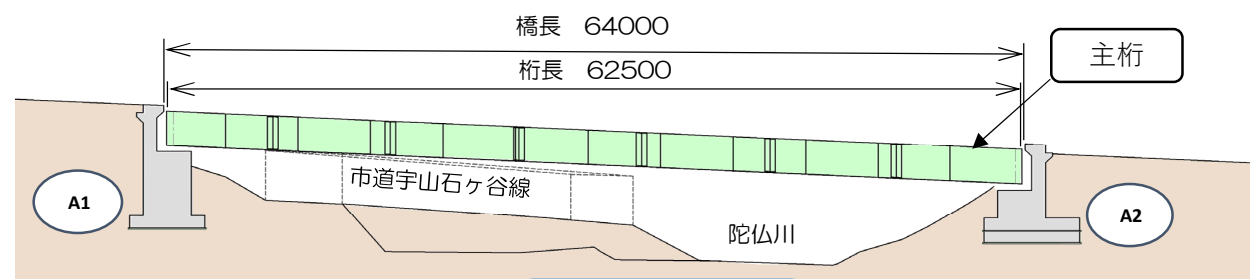

## 和歌山工場 仮組立状況



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：高田機工株式会社 ☎0799-53-3615

作業事務所 住所：兵庫県洲本市桑間576-2

陀仏川橋上部 監理技術者：小田 龍太郎



# 高田機工株式会社
