



お知らせ 洲本バイパス陀仏川橋上部工事

令和8年10月度

工事進捗に伴い、新たに陀仏川橋上部工事を受注しましたのでお知らせします。

9月24日から主桁の送り出し架設を行い9月29日に手延べ桁がA1橋台に到達しました。

10月は引き続き送り出し架設、送り出し完了後、降下設備の組立をしていきます。

無事故・無災害・早期完成を目指して工事を進めていきたいと思っておりますので、

何卒ご理解とご協力をお願いします。


[概要]

工事名 洲本バイパス陀仏川橋上部工事
路線系 洲本バイパス
工事場所 兵庫県洲本市宇山2丁目地先
工期 自)令和7年8月12日 至)令和9年1月29日
鋼単純幅桁橋 狭長:64.0m 総幅員:13.0m
概要 工場製作工、鋼橋架設工、鋼橋現場塗装工
床版工、橋梁付属物工

[工程表]

	令和8年					令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工							
ヤード整備工							
仮設工							
架設工							
床版							
付属物工							

[工事状況写真] (撮影日: R8.9.29)

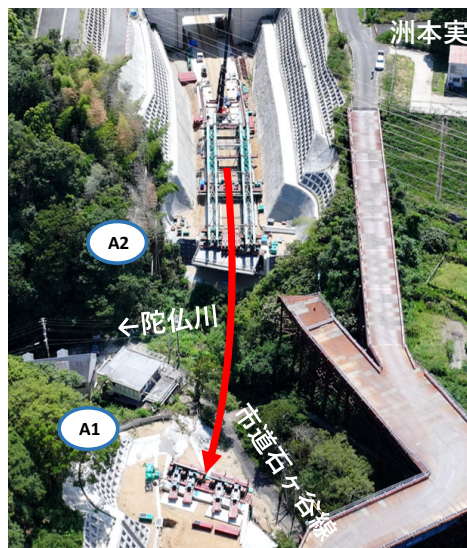

※9/24～ 送り出し架設 施工中

手延べ桁

主桁地組



発注者: 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者: 高田機工株式会社 ☎0799-53-3615

作業事務所 住所: 兵庫県洲本市桑間5 7 6 - 2

陀仏川橋上部 監理技術者: 小田 龍太郎



高田機工株式會社



工事のお知らせ R8洲本バイパスB地区法面他工事

令和8年10月

近隣の皆様へ

新たに、R8洲本バイパスB地区法面他工事を受注しました。

主に、法面を安定させるための工事で、法枠工・鉄筋挿入工が主な工事となります。

10月の予定として、道路土工(掘削工)、法面工(吹付工・鉄筋挿入工)を施工していく予定です。

騒音・振動等につきまして、周辺環境への配慮を十分に行いながら、安全第一で作業を進めてまいります。

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

概要

工事名 R8洲本バイパスB地区法面他工事
工事場所 洲本市宇山2丁目地先
工期 R8.9.1～R9.3.31
作業時間 月曜日～金曜日の平日8時～17時
工事概要 道路土工、法面工、擁壁工
石・ブロック積工、排水構造物工

工事工程表

令和8年10月	10	20	30	備考
準備工				
道路土工				
法面工①				
擁壁工				
石・ブロック積工				
排水構造物工				
仮設工				

状況写真 (撮影日: R8.9.25)



【発注者】 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所

【施工者】 株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

【作業事務所】 洲本市炬口 炬口漁港区域内

【現場責任者】 岡田 匠 (現場代理人兼 監理技術者)



確かな技術
豊かな心で未来を築く
