

工事ビラ (9月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

令和元年9月度

工事概要

住民の皆様へ

【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区において、皆様の協力により予定通り進んでおります。

残土運搬は8月中は中断していましたが、9月4日から再開する予定です。

工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、引き続き皆様のご理解とご協力を、お願いします。


工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)
 工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日
 作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社
 現場代理人：馬場 正永
 監理技術者：尾崎 範徳
 現場事務所(炬口漁港内)
 ☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226

確かな技術 豊かな心で未来を築く
 株本建設工業株式会社



現在の施工状況

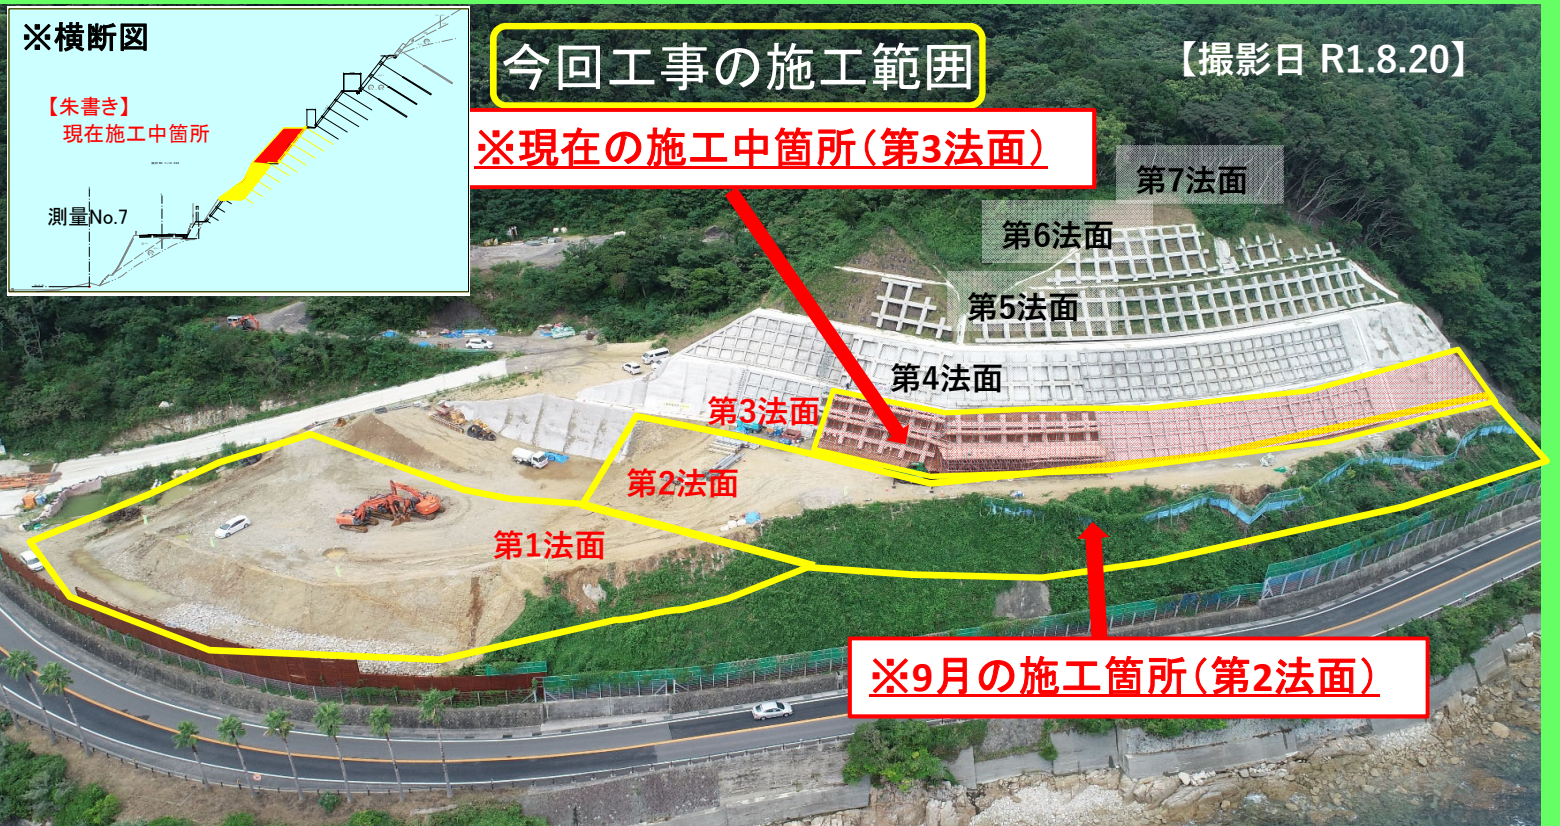

状況写真

ラス金網張り状況



モルタル吹付状況



道路清掃状況



アンカー施工状況



鉄筋挿入施工状況




【工事内容】

- 掘削工: 19,600m³、残土処理工: 19,600m³、コンクリート吹付工: 524m²
- 法枠工: 1,133m²、アンカー工: 26本、鉄筋挿入工: 474本、排水工: 313m

【作業内容 今月(9月)作業予定】

- 道路土工(第2法面) 掘削、法面整形、積込
- 法面工(第3法面) 鉄筋挿入工
- 排水構造物工(第3法面) 小段排水
- 残土運搬 養宜圃場と八幡北圃場へ運搬

工事用車両ゼッケン(No.1～No.20)



工程表

	9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
法面工(第3法面)	鉄筋挿入工						
掘削工(第2法面)	掘削、法面整形、積込						
排水構造物工	小段排水工						
残土運搬工	9/4～養宜圃場へ			9/18～八幡北圃場へ			南あわじ市(養宜) 南あわじ市(八幡北)
交通誘導警備員							炬口出入口3名配置
