

工事ビラ (10月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

令和元年10月度

工事概要

住民の皆様へ

【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区において、皆様の協力により予定通り進んでおります。

残土運搬は9月4日から再開し、10月は養宜と塔下へ運搬する予定です。

工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、引き続き皆様のご理解とご協力を、お願いします。

工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)

工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日

作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社

現場代理人：馬場 正永

監理技術者：尾崎 範徳

現場事務所(炬口漁港内)


☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226

確かな技術 豊かな心で未来を築く


株本建設工業株式会社



現在の施工状況

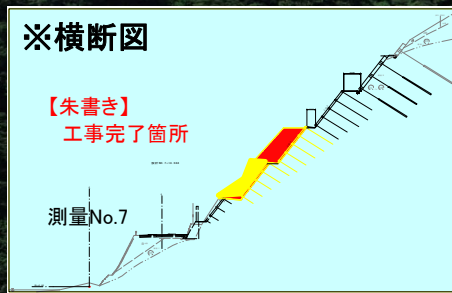

今回工事の施工範囲

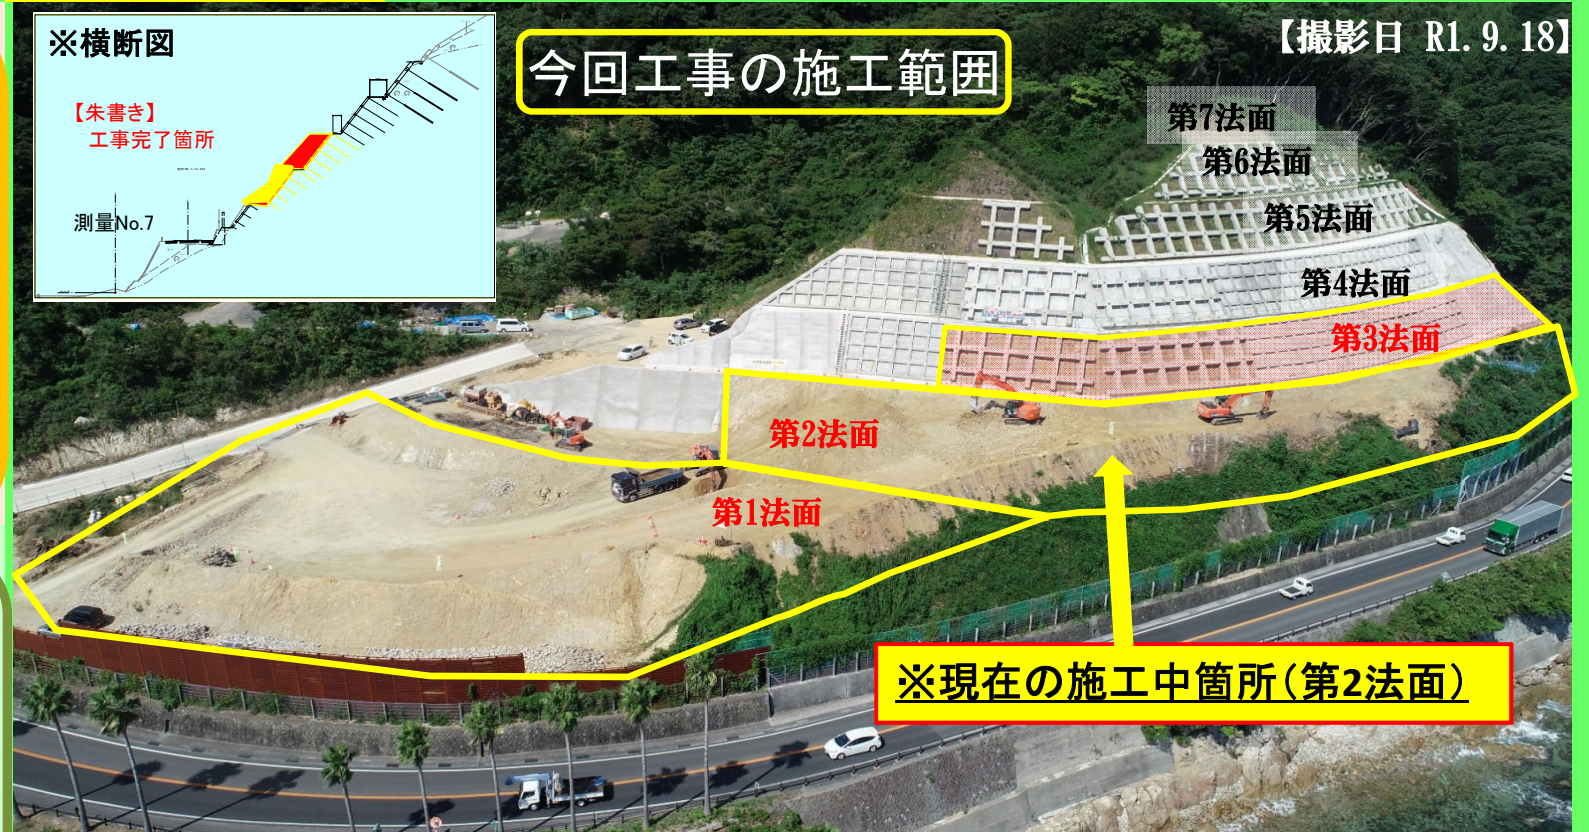

【撮影日 R1.9.18】

※現在の施工中箇所(第2法面)

状況写真

第2法面 掘削状況



残土積込状況



残土運搬(八幡北)



【工事内容】

・掘削工: 28,300m³、残土処理工: 28,300m³、コンクリート吹付工: 755m²

・法枠工: 1,609m²、アンカー工: 26本、鉄筋挿入工: 474本、排水工: 296m

【作業内容 今月(10月)作業予定】

・道路土工(第2法面) 掘削、法面整形、積込

・排水構造物工(第2法面) 縦排水

・残土運搬 養宜圃場と塔下へ運搬

工事用車両ゼッケン(No.1～No.20)

W1000×H500

洲本バイパス
炬口地区法面改良工事

No. 1

株本建設工業(株)

工程表

	10月						備考
	5	10	15	20	25	30	
掘削工 (第2法面)	掘削、法面整形、積込						
残土運搬工 (養宜へ)	養宜2-2工区			養宜2-3工区			南あわじ市(養宜)
残土運搬工 (塔下へ)							洲本市五色町鮎原(塔下)
排水構造物工	縦排水			縦排水、小段柵			
交通誘導警備員							炬口出入口3名配置 養宜圃場 1名配置

ブレーカー掘削



炬口漁港公園内除草

