



お知らせ 洲本バイパス陀仏川橋上部工事

令和8年8月度

工事進捗に伴い、新たに陀仏川橋上部工事を受注しましたのでお知らせします。
陀仏川橋は橋長64mの鋼製橋梁で、**現在、A1A2橋台の設備が完了しました。**
8月より手延桁の組立を行い中旬以降に主桁の地組を行います。
無事故・無災害・早期完成を目指して工事を進めていきたいと思っておりますので、
何卒ご理解とご協力をお願いします。

工 事 名	洲本バイパス陀仏川橋上部工事	工事概要	工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、
路 線 名	洲本バイパス		床版工、橋梁付属物工等
工事場所	兵庫県洲本市宇山2丁目地先	受 注 者	高田機工株式會社
工 期	自) 令和7年8月12日 至) 令和9年1月29日		TEL 06-6649-5110
鋼単純細幅箱桁橋 橋長：64.0m、総幅員：13.0m			

[工程表]


	令和8年								令和9年	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工										
ヤード整備工										
仮設工										
架設工										
床 版										
付属物工										

※夏季休暇 8/8～8/16

※工事中止期間による工期延期含めず

[送り出し出し架設概要図]

9/中旬 送り出し予定

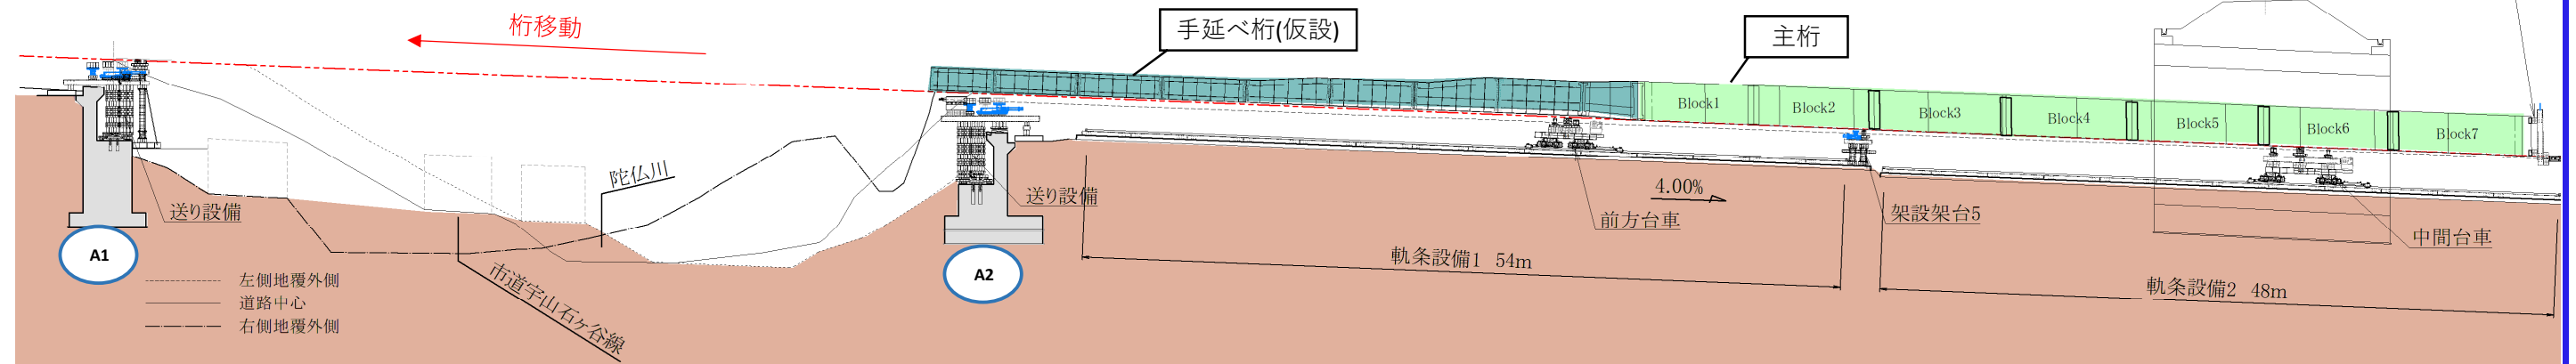

[工事状況写真] (撮影日：R8.7.17)



A2橋台付近 仮設工 (ヤード整備完了)



A1橋台付近 仮設工 (ヤード整備完了)



A2橋台背面 仮設工 (ヤード整備完了)

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：高田機工株式会社 ☎0799-53-3615

作業事務所 住所：兵庫県洲本市桑間576-2

陀仏川橋上部 監理技術者：小田 龍太郎

高田機工株式會社
